


## 今後のスケジュール（予定）


	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度以降
工程	Step1 Step2		Step3		Step4~Step7			

### Step1 既存校舎改修




①特別教室等改修

### Step2 既存西校舎解体




②特別教室棟・プール解体

### Step3 新校舎Ⅰ期建設




③新校舎Ⅰ期建設  
④渡り廊下建設  
⑤引越し

### Step4 既存北・東校舎解体




⑥既存校舎解体

### Step5 新校舎Ⅱ期建設




⑦新校舎Ⅱ期建設  
⑧引越し

### Step6 既存体育館解体



⑨既存体育館解体  
⑩渡り廊下解体

### Step7 グラウンド整備



⑪グラウンド整備

#### 凡例

■ 新築工事・改築工事


■ 解体工事

▲ 生徒動線

▲ 工事

※ 本資料における「今後のスケジュール(予定)」、「新校舎イメージ」、「工事ステップ図」、「ランニングcommonsイメージ」及び「平面計画図」は、現時点での予定であり、実施設計における詳細な検討及び協議等に伴い、今後変更する場合があります。

■完成予想図

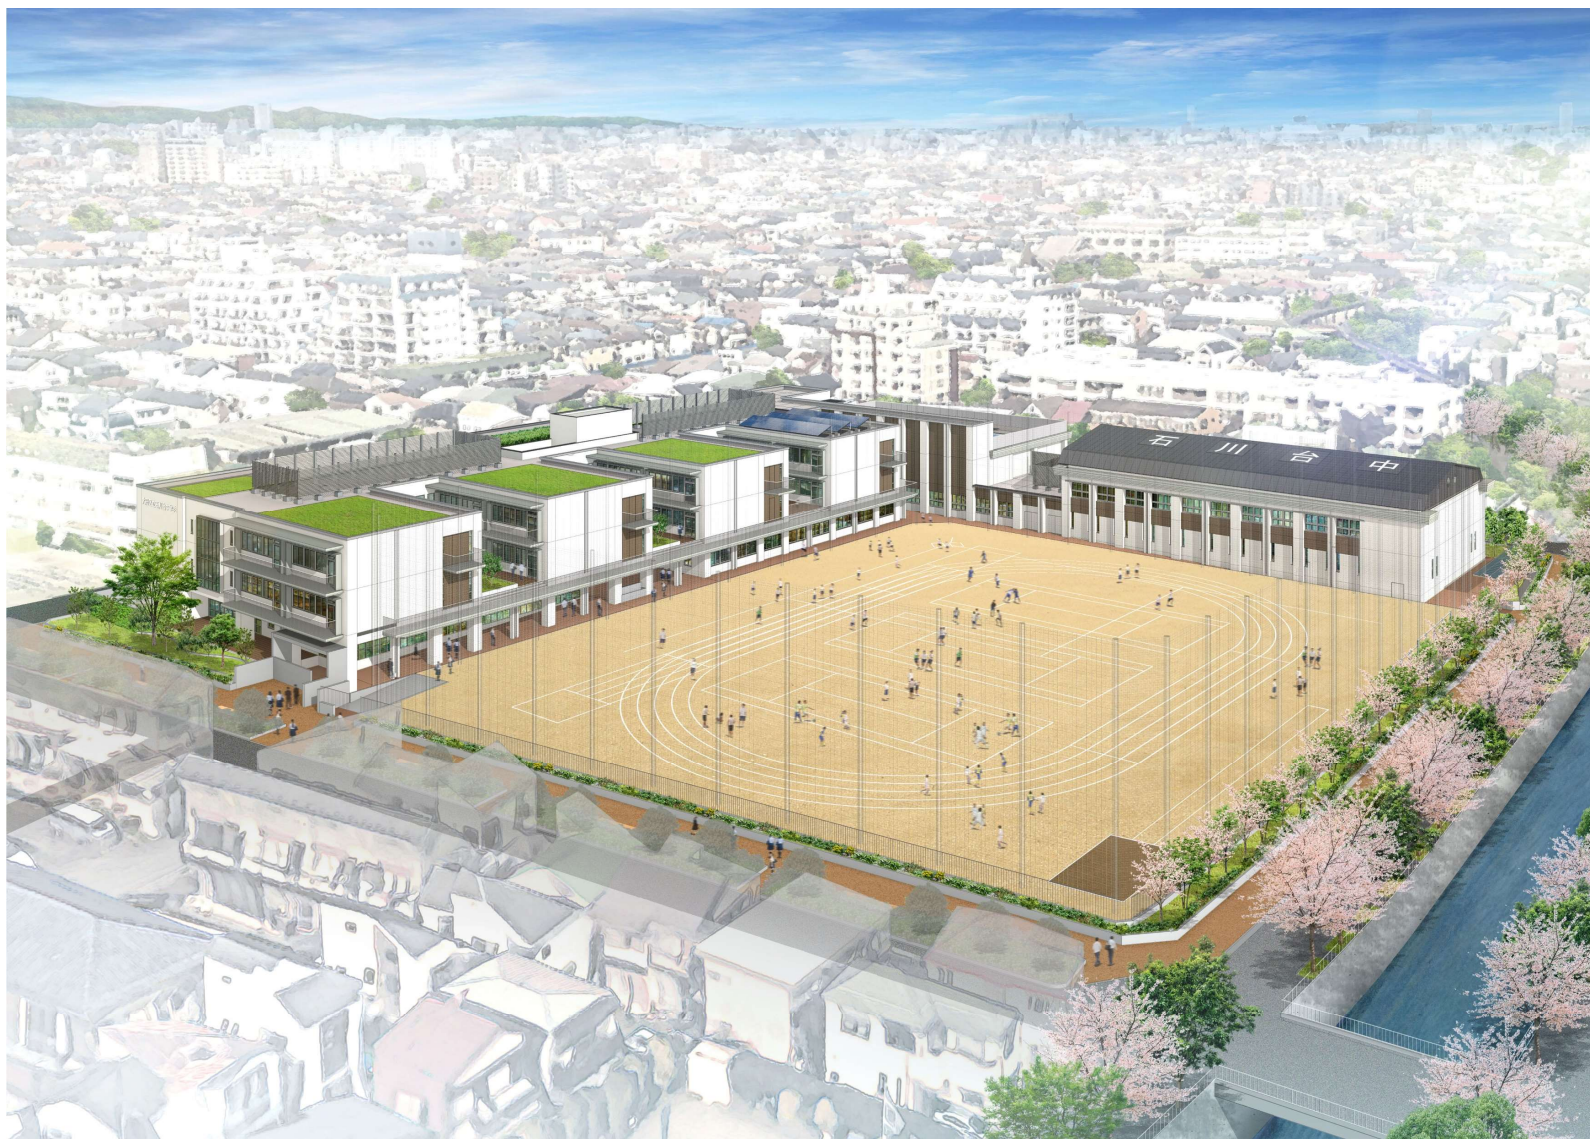

■完成予想図





終
