


①東門擁壁設置、南側擁壁更新・スロープ 工事 2024年4月初旬～6月下旬

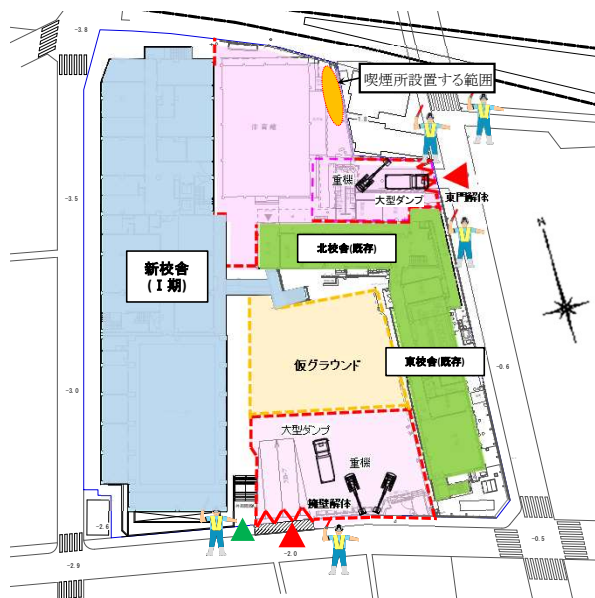


・南側擁壁更新・スロープ工事

学校敷地内(一部設置済み)と歩道上に仮囲い鋼製パネル(高さ3m)を設置し、I期工事で設置済の南側ゲートより工事車両の搬入を行います。敷地内部側から重機を2台を用いて既存擁壁を圧砕し取壊しを行います。また、取壊したコンクリートガラや発生土を大型ダンプで場外に搬出します。(最大20台/日：予定) コンクリートを破碎して壊していくことも考えられるので大きな騒音と振動が発生します。

・東門擁壁設置工事

工事エリア内に仮囲い鋼製パネル(高さ3m)を設置し、東側ゲートより工事車両の搬入を行います。敷地内部側から型重機を1台を用いて既存擁壁・門柱・コンクリート舗装等を圧砕し取壊しを行います。また、取壊したコンクリートガラや発生土を大型ダンプで場外に搬出します。(最大10台/日：予定) コンクリートを破碎して壊していくことも考えられるので大きな騒音と振動が発生します。

②南側擁壁更新・スロープ 工事 2024年6月下旬～8月初旬

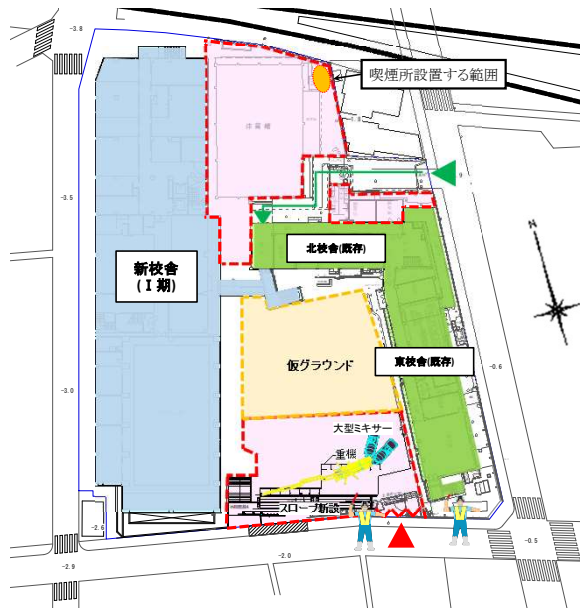


・南側擁壁更新・スロープ工事

鉄筋の配筋やコンクリートを流し込む為の型枠を設置し、ミキサー車で搬入したコンクリートを専用圧送車を用いて流し込み、躯体を構築します。(最大10台/日:予定)
コンクリート打設時には圧送車と生コン車による騒音が発生します。資材搬入時は、ラフタークレーンが1台稼働します。

また、この期間(6月下旬～8月初旬)は、南側正門工事の為通行止めとし、外構工事・仕上げ工事等を行います。

③体育館解体工事 南面スロープ新設工事 2024年8月初旬～10月末

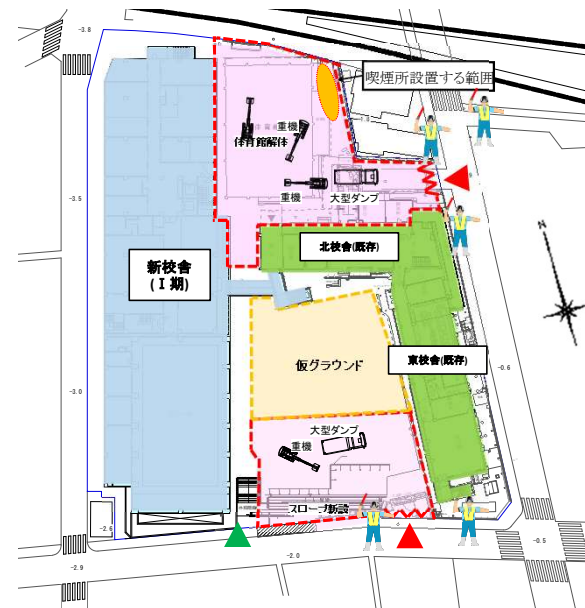

・南側擁壁更新・スロープ工事

仮グラウンドの舗装工事を重機を使用し行います。また、仮設の防球ネットの組立や各所の仕上げ工事を行います。
(南側擁壁更新・スロープ工事については8月末完了予定)

・体育館・北校舎一部解体工事

学校敷地内境界際に仮囲いの鋼製パネル(高さ3m)を設置し、東側ゲートより工事車両の搬入を行います。解体する建物外周に養生足場としてパネルやネットを設置します。建物内部側から重機を用いて圧砕し取壊しを行います。取壊したコンクリートガラや発生土を大型ダンプで場外に搬出します。(最大20台/日：予定) 取壊し時は、コンクリート圧砕時や重機移動時、コンクリートを破碎して壊していくことも考えられるので大きな騒音と振動が発生します。

工程表


2024年(令和6年)												2025年(令和7年)												2026年(令和8年)								
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月					
Ⅱ 期工事期間																																
① 東門擁壁設置 南側擁壁更新・ スロープ 工事			② 南側擁壁 更新・ スロープ 工事			③ 体育館 解体工事・ 南面スロープ 新設工事			④ 山留杭打設工事 既製コンクリート杭打設工事 掘削工事												⑤ 基礎・地下工事						⑥ 地上工事・内外装仕上工事・外構工事					

凡例

- 仮囲い
- 〰 工事ゲート
- 警備員
- 工事用出入口
- 児童
学校関係者
出入口

※工程表は、工事着手時点での予定であり、天候不良やその他の理由により多少変更となる場合がありますので予めご了承ください。

④山留杭打設工事・既製コンクリート杭打設工事・掘削工事
2024年11月～2025年5月末

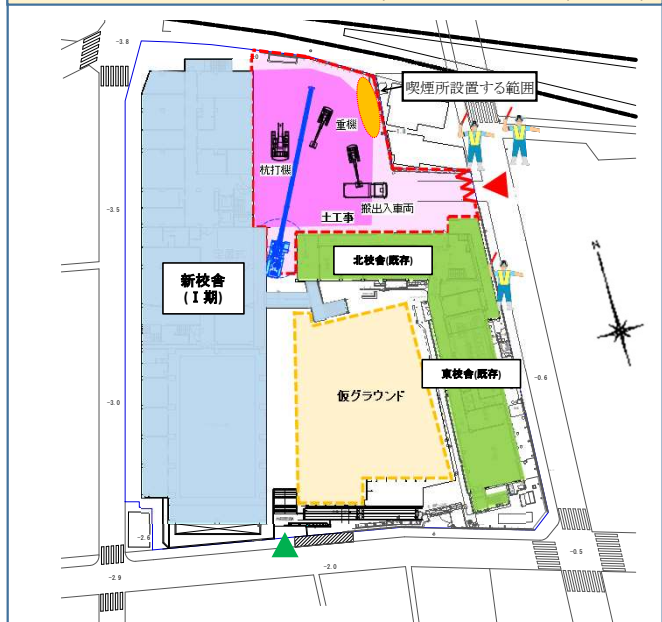

・山留杭打設工事

杭打設専用機械を用いて地面をドリルで掘削を行い、鋼材を地中に埋め込みます。重機稼働時に騒音と振動が発生します。


・既製コンクリート杭打設工事

トレーラーにて搬入したコンクリート製の杭材をクレーンで荷下ろします。その後、杭打設用大型重機を使用し、ドリルで地面を掘削後、杭を地中に埋め込みます。重機稼働時に騒音と振動が発生します。敷地際の作業では、仮囲い3mの上部に養生シートを設置し、泥等の飛散対策を行います。

・掘削工事

大型重機を3台使用し、グラウンドの高さより下の部分の掘削と発生した土の大型ダンプへの積込を場外に搬出します。(最大50台/日：予定) 重機稼働時に騒音と振動が発生します。揚重機として、タワークレーン1台設置します。

⑤基礎・地下工事
2025年6月～2025年9月末

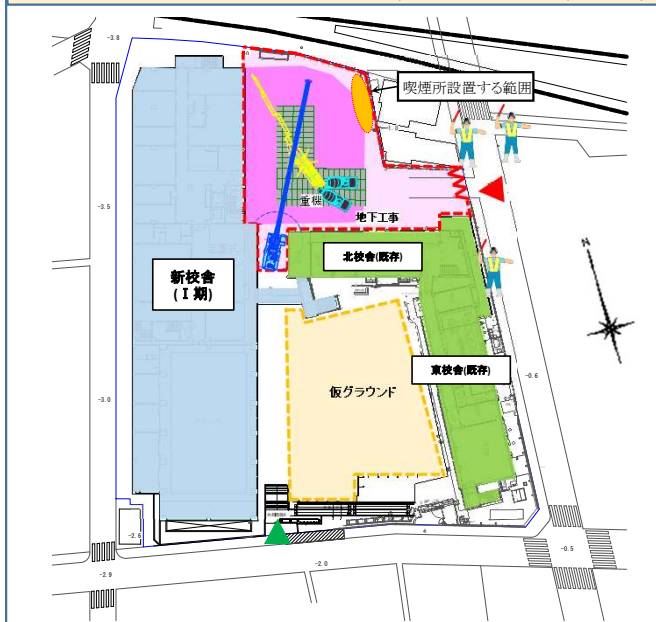


・基礎・地下工事

鉄筋の配筋やコンクリートを流し込むための型枠を設置し、ミキサー車で搬入したコンクリートを専用圧送車を用いて流し込み、基礎と建物地下部分を構築します。(最大50台/日:予定)

コンクリート打設時には圧送車と生コン車による騒音が発生します。

工事用通路として仮設構台を設置します。また、揚重機として、タワークレーン1台が稼働します。

⑥地上工事・内外装仕上工事・外構工事
2025年10月～2026年7月末

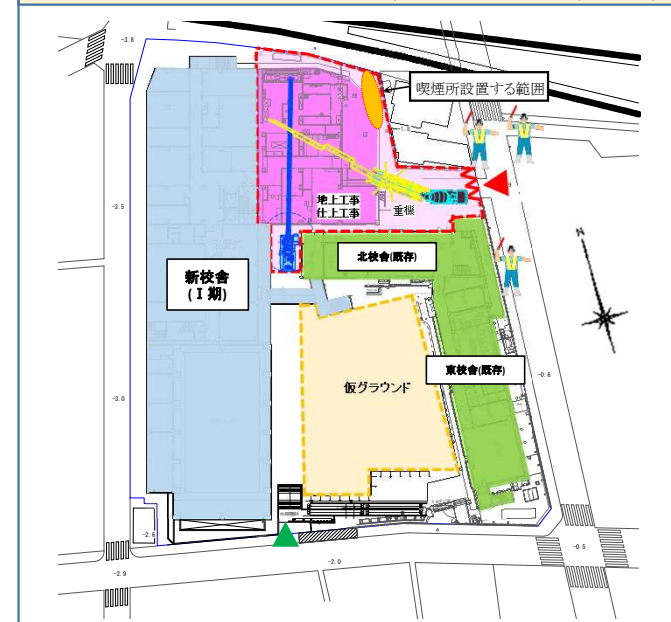

・地上工事・内外装仕上工事・外構工事

地下と同様に鉄筋の配筋、型枠を設置してコンクリートを打設していきます。並行して内装仕上工事と外装仕上工事を行っていきます。

コンクリート打設時には圧送車と生コン車による騒音が発生します。

防水工事の際には、アスファルトを加熱融解する際に煙と独特な臭いが発生します。臭気対策を行うとともに関係機関等への事前の届出を行います。

建物外周には、足場を設置し資材等の飛散養生を行います。揚重機として、タワークレーン1台が稼働します。

工程表

2024年(令和6年)												2025年(令和7年)												2026年(令和8年)										
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月							
Ⅱ 期工事期間																																		
① 東門擁壁設置 南側擁壁更新・ スロープ 工事				② 南側擁壁 更新・ スロープ 工事				③ 体育館 解体工事・ 南面スロープ 新設工事				④ 山留杭打設工事 既製コンクリート杭打設工事 掘削工事								⑤ 基礎・地下工事				⑥ 地上工事・内外装仕上工事・外構工事										

凡例	
---	・・・仮囲い
〰〰〰	・・・工事ゲート
👷	・・・警備員
▲	・・・工事用出入口
▲	・・・児童 学校関係者 出入口

※工程表は、工事着手時点での予定であり、天候不良やその他の理由により多少変更となる場合がありますので予めご了承ください。
