くすのき園及び南六郷福祉園増築及び大規模改修工事スケジュール

既存：くすのき園及び南六郷福祉園

〈現くすのき園〉
・就労継続支援Ｂ型、２階建て、約 1400 ㎡

〈現南六郷福祉園〉
・生活介護、２階建て、約 1400 ㎡

STEP1

〈旧産学連携施設〉
・就労継続支援Ｂ型の仮移転のため、用途変更を伴う改修を実施

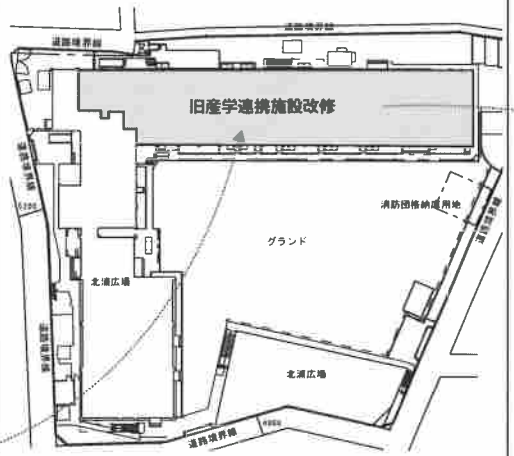

STEP2 準備工事



：改修範囲

STEP2

〈現くすのき園・増築棟工事〉
・STEP1 終了後、就労継続支援Ｂ型を旧産学連携施設に移転
・移転後、現くすのき園側の改修と増築棟を建設

〈現南六郷福祉園〉
・既存のまま運用

：改修範囲

STEP3

〈現くすのき園・増築棟工事〉
・STEP2 終了後、現くすのき園に生活介護を移転、増築棟に就労継続支援Ｂ型を移転、増築棟最上階に短期入所を新設

〈現南六郷福祉園〉
・現機能をくすのき園側に移転後、現南六郷福祉園側の改修を実施

：改修範囲
